


REPORTE FOTOGRAFICO DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS 2006-2007

Edificio Principal

Planta Baja

Se observa la falta colocación de sello de plástico en los ventanales de aluminio en todo el nivel.

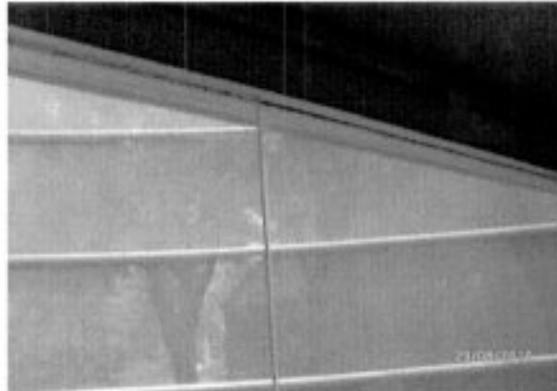

Planta Baja

Se observa la falta de colocación de pisos de mármol en firmes de la planta baja.



Planta Baja


Se observa que el cristal esta estrellado como consecuencia de la mala colocación del mismo.





1º Nivel

Se observa la deficiente colocación de la loseta en muros de sanitarios ubicados entre el 1º y planta baja, así como las diferentes tonalidades de la misma.

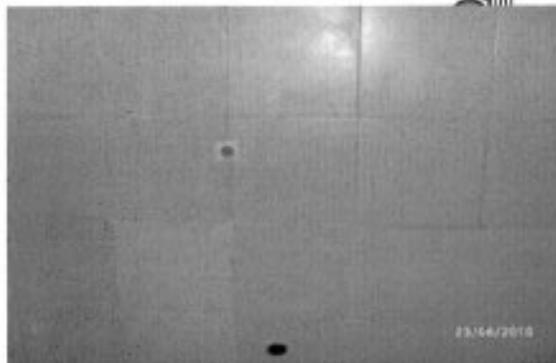

1º Nivel

Se observa la falta colocación de sello de plástico en los ventanales de aluminio en todo el nivel.



1º Nivel


Se observa que los cables de energía eléctrica están cortados en cada una de sus salidas.






2º Nivel

Se observa que los cables de energía eléctrica están cortados en cada una de sus salidas.

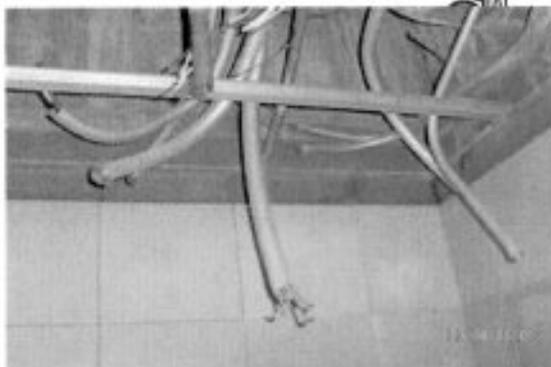


2º Nivel

Se observa la deficiente colocación de la loseta en muros de sanitarios ubicados entre el 2º y 1º nivel, así como las diferentes tonalidades de la misma.

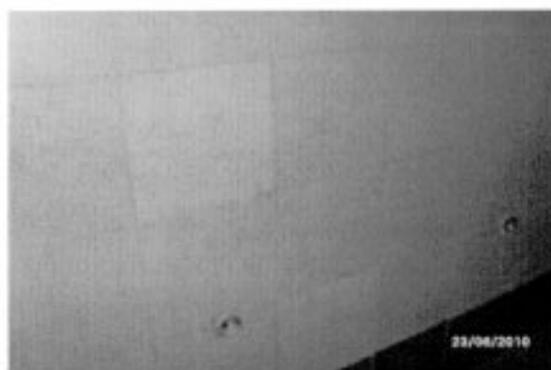

2º Nivel


Vista de la loseta de baños de dirección mal colocada, como consecuencia de que la junta esta desalineada.

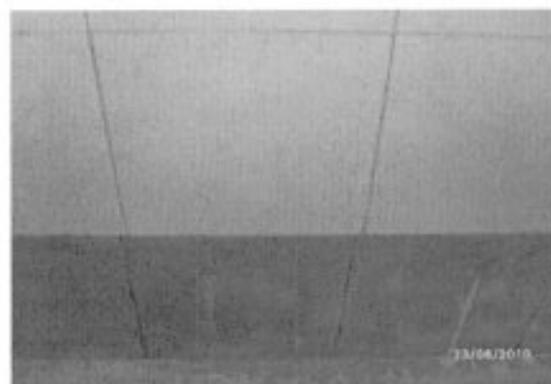



2º Nivel

Se observa que el cristal que integra el ventanal de aluminio de encuentra estrellado derivado de su mala colocación.

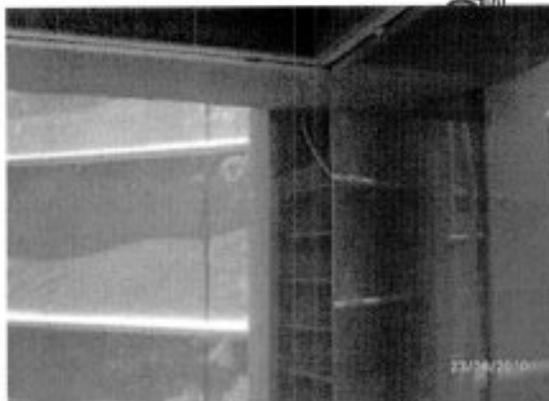


2º Nivel

Se observa la falta colocación de sello de plástico en los ventanales de aluminio en todo el nivel.



3º Nivel


Se observa que falta la colocación de vidrios en ventanales perimetrales.

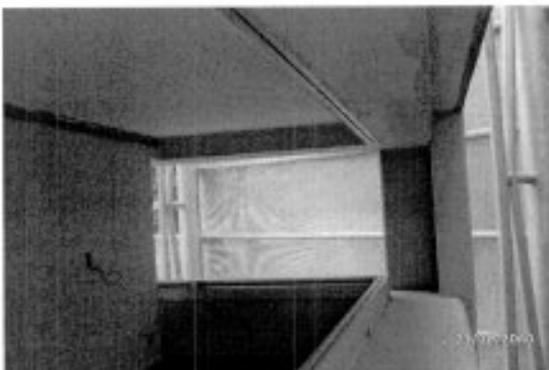



3º Nivel

Se observa la deficiente colocación de la loseta en muros de sanitarios ubicados entre el 4º y 3º nivel

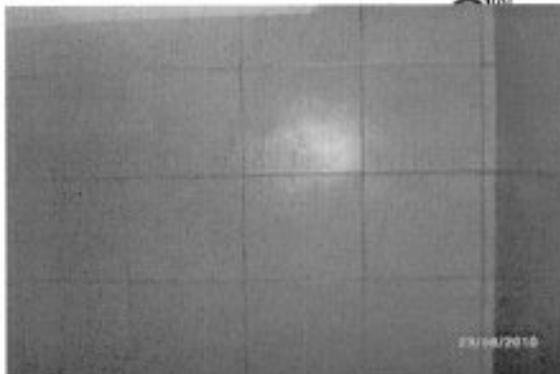


3º Nivel

Se observa la falta colocación de sello de plástico en los ventanales de aluminio en todo el nivel



3º Nivel


Se observa la falta colocación de sello de plástico en los ventanales de aluminio en todo el nivel

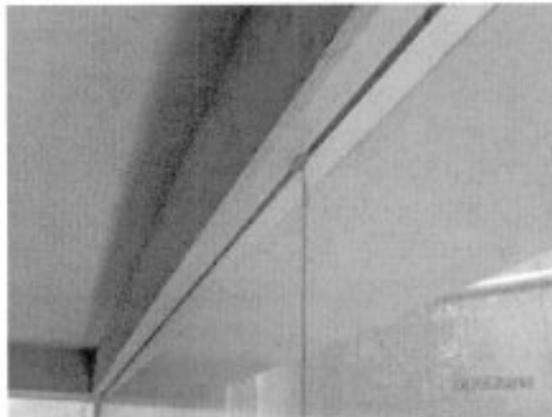




3° Nivel

Se observa la deficiente colocación de la loseta en muros de sanitarios ubicados entre el 3° y 2° nivel

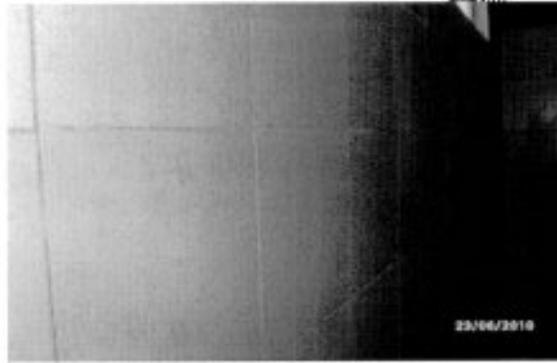


4° Nivel

Se observa la falta de colocación de sello en ventanales de aluminio.

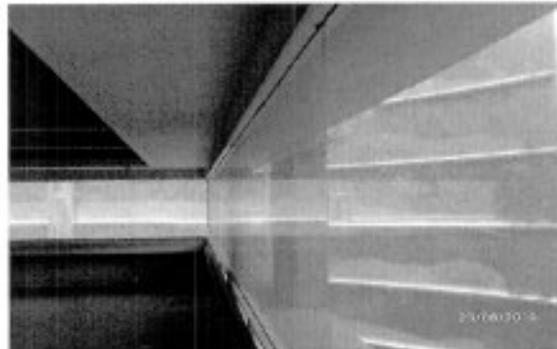

4° Nivel

Se observa que los cables de energía eléctrica están cortados en cada una de sus salidas.

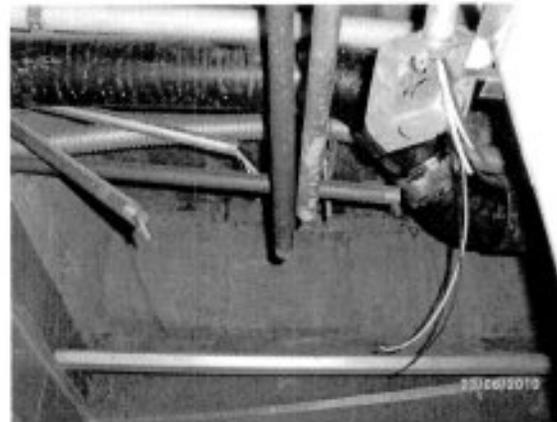

5° Nivel

Se observa el deterioro del lecho bajo de la losa y del elemento estructural, como consecuencia de la filtración de agua pluvial, por la falla de impermeabilización.




5° Nivel

Tirante de agua en el piso, esto se deriva por la mala nivelación del mismo y la filtración de agua pluvial.



5° Nivel

Filtración y deterioro en el plafón falso por filtración de agua pluvial

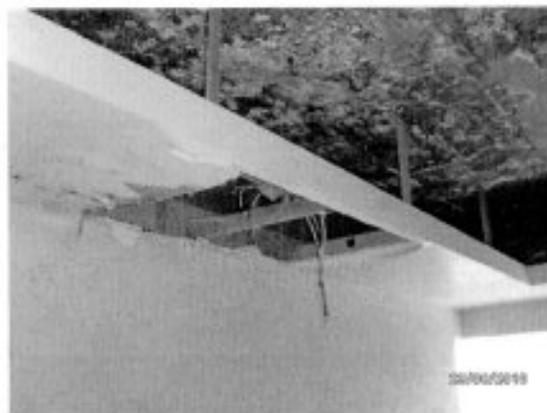

AZOTEA

Fallas en la impermeabilización, como consecuencia de la mala aplicación en la azotea del edificio sede



5° Nivel

Se observa la falta de colocación de sello en ventanales de aluminio.



AZOTEA

Se observa un tirante de agua, derivado por la mala nivelación del área en la azotea.



FACHADA EXTERIOR


En relación a los trabajos ejecutados *El suministro y colocación de fachadas*, en el Edificio Principal y de la Comisión Nacional de Bioética, se presentaban las características siguientes:



Vista de la parte superior de la fachada del edificio principal, donde se aprecian deformaciones en las láminas, por mala colocación.



Vista de la parte superior con colindancia a la Unidad de Seminarios

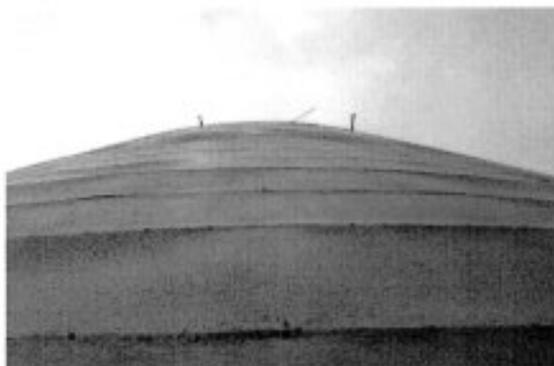


Oxidación por mala aplicación del antioxidante
No. 16





Lamina defectuosa la perforación de la lamina no es la adecuada.

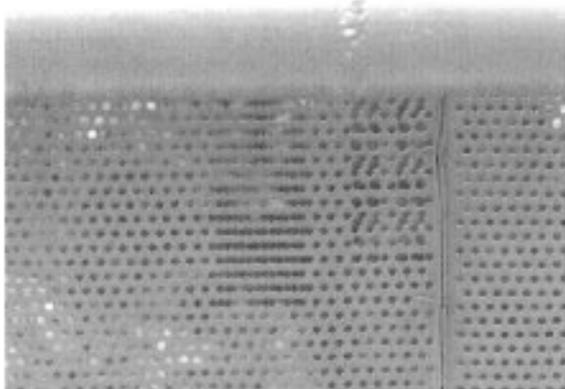

Lamina de aluminio desprendida por falta de tornillos de sujeción

